


慈孝园改扩建项目（一期）

设计图纸答疑（二）

1、电气、路灯工程

1.1 浇灌的电磁阀，需明确是否仅套管。

回复：除了预埋管外，还需穿线，详见补充的电磁阀系统图，如下图。

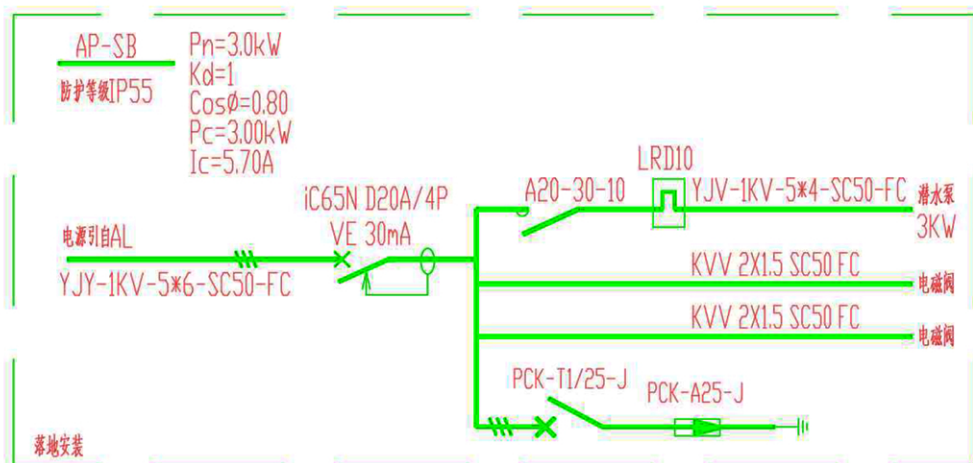


1.2 手孔井复合井盖型号未明确。


回复：复合井盖采用 B125 型井盖；铸铁井盖采用 D400。

1.3 园建 ZT-6 图纸，北边路灯单臂路灯光源为 LED，图中“更换灯泡设备”是指更换哪个部位？

回复：为更换成套 LED 灯头。

1.4 经现场踏勘，AL 箱位置已有配电箱，是否需要重新更换电箱，进线电缆是否重新敷设？

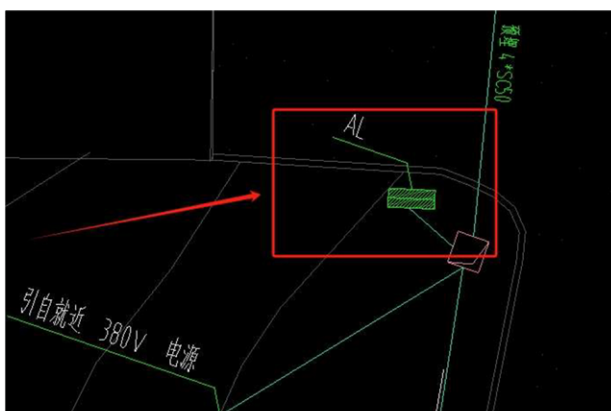

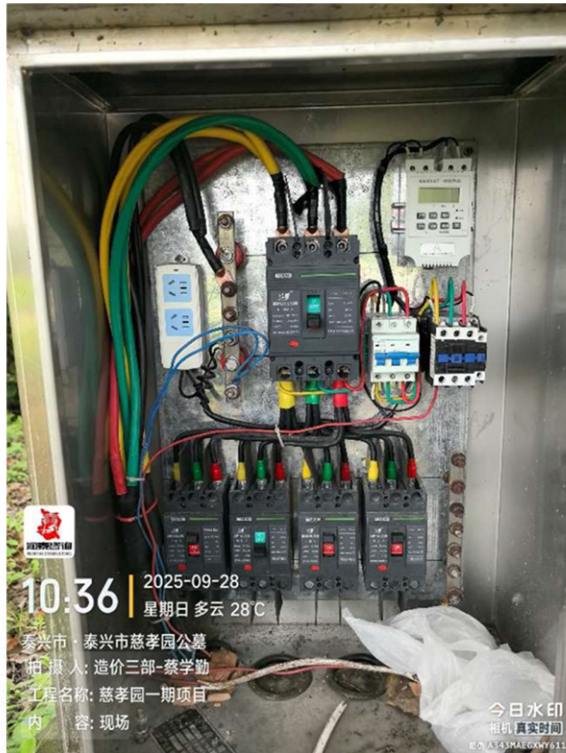

回复：AL 为新建配电箱，电源引自原有配电箱。原有配电箱不做改动。

2、铺装工程

2.1 TY-1 图纸中人行铺装做法，混凝土配筋（三级钢 8@250，单层双向）是否必要。

回复：根据建设单位反馈，原状已建墓区及配套道路，道路结构未配备钢筋加强，以及场地土体较软等因素，要求设计单位对新建墓区道路结构层做适当加强，避免出现与现状道路多处塌陷的情况，综上，我设计方建议配置钢筋。



匠心设计集团有限公司

2025年09月28日
